




VIRTUAL OFFICE

Virtual office

Virtual office is a software product whose main purpose is to support and control the construction process and to digitize the main business tasks.

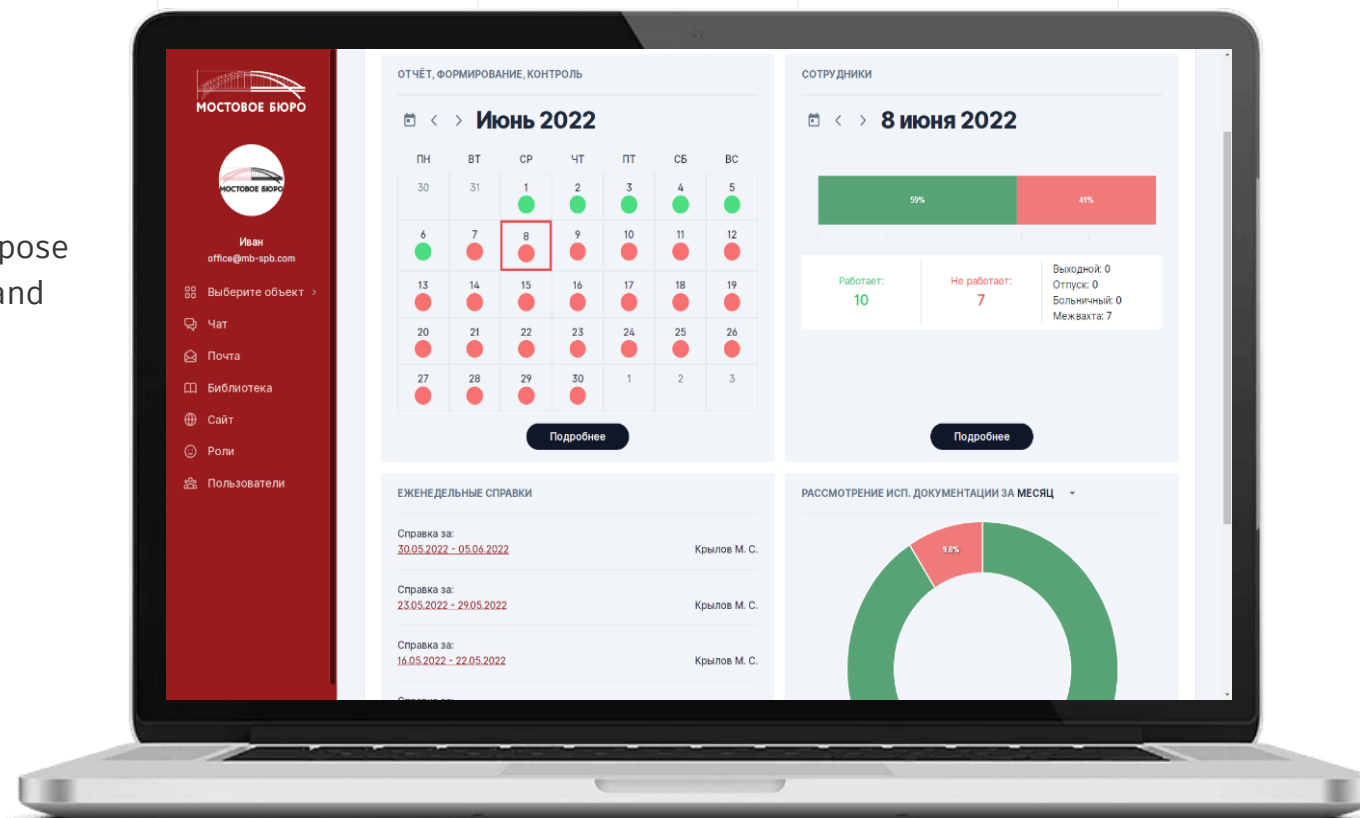


Virtual office

Virtual Office tools allow you to:


- control the timeliness and quality of services provided;
- analyze the workload of each individual employee and redistribute it if necessary;
- generate reporting documentation in automatic mode;
- to carry out operational communication and interaction with construction participants - to transmit and to receive the necessary information on the process of control;

Tasks and opportunities within the system are determined for each individual group of users.

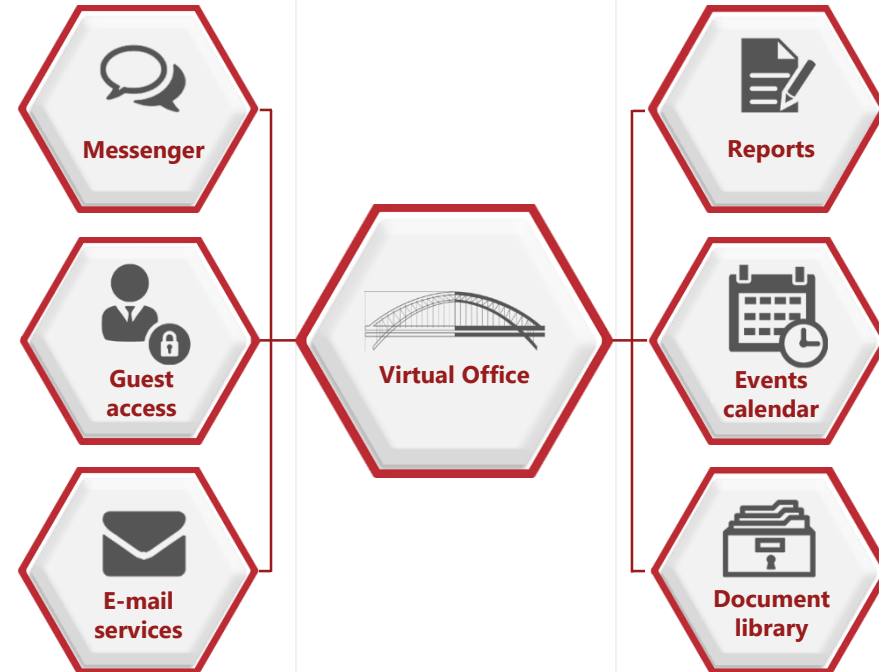

Virtual office

The structure of a virtual office contains several successive stages:

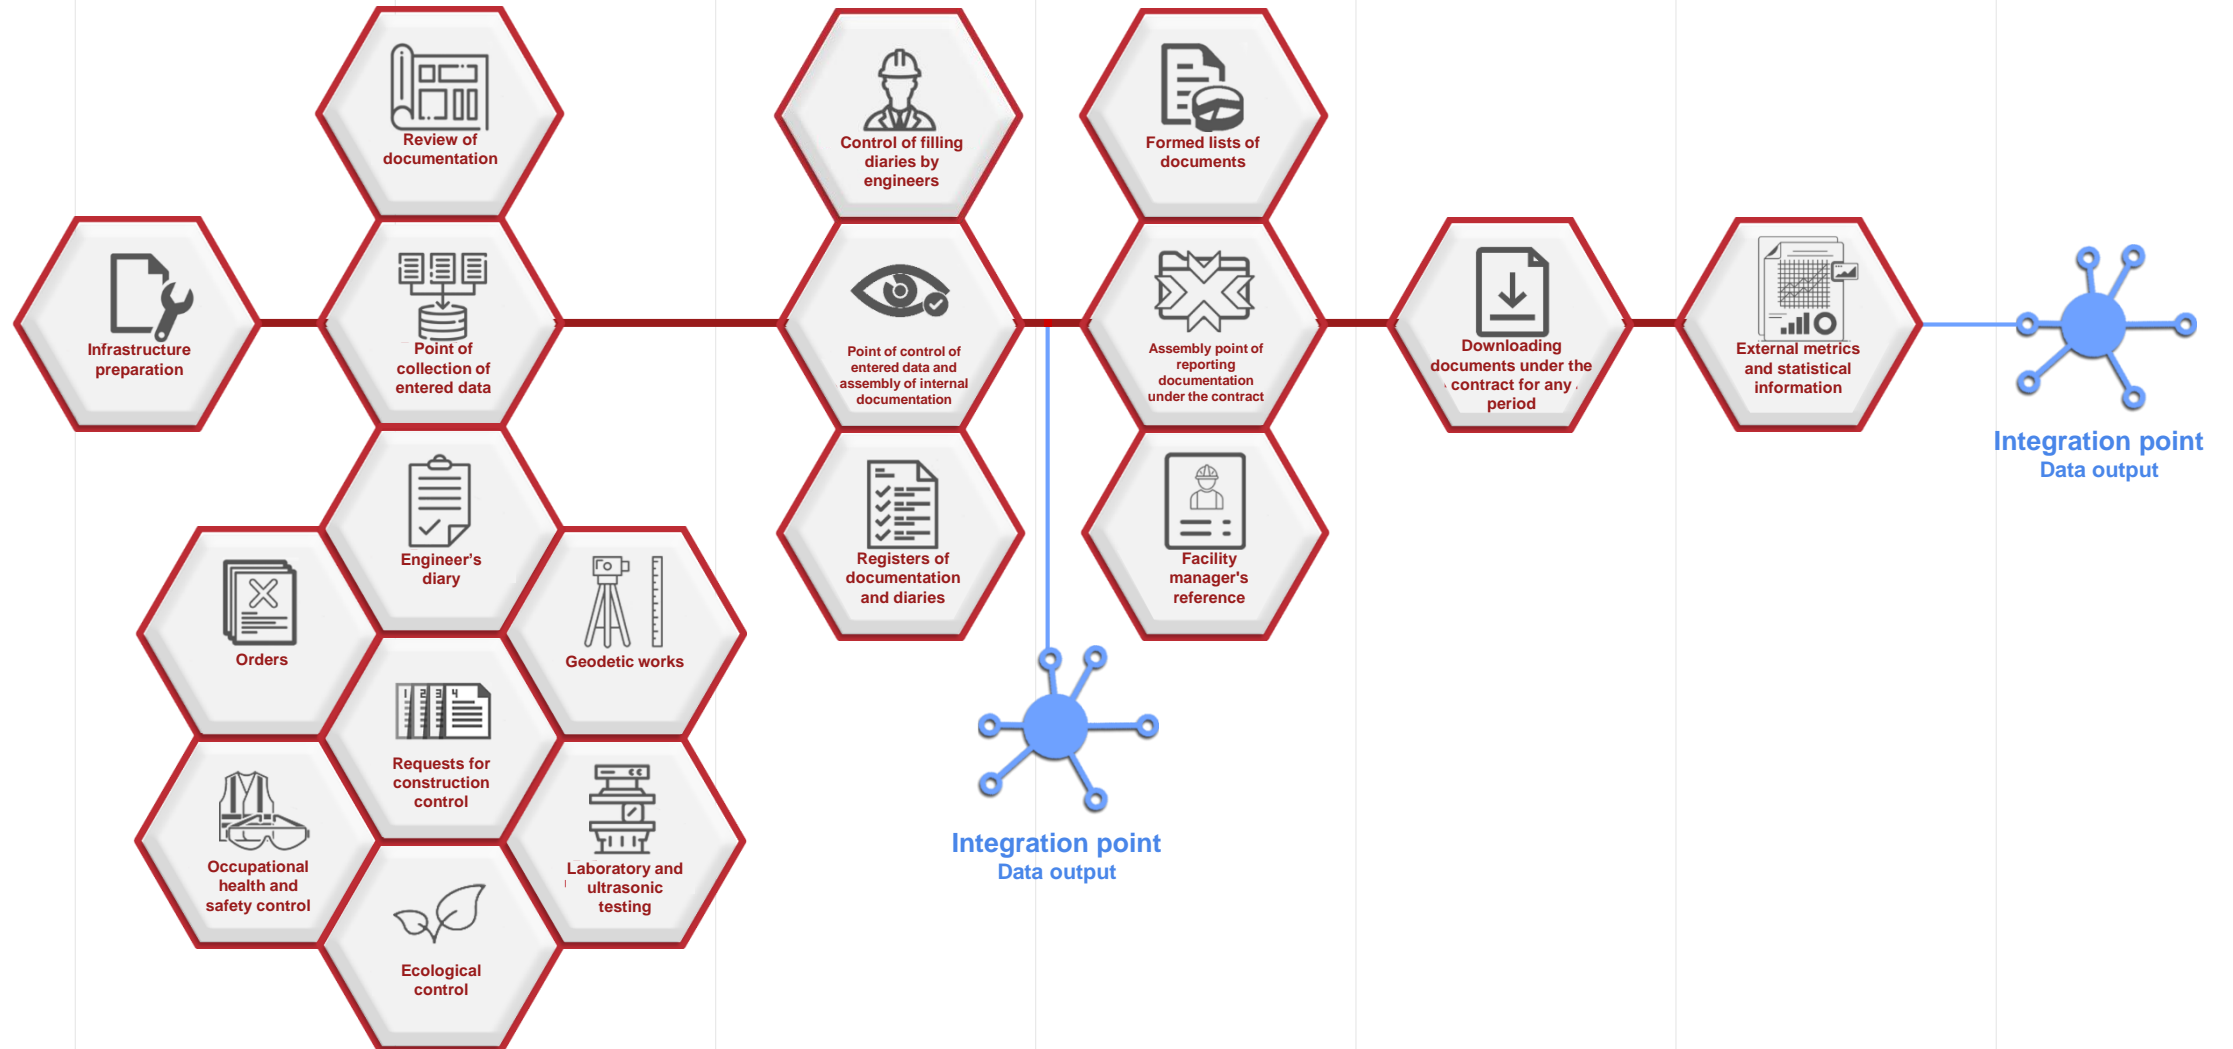

Contractor

Submission of requests for building control



Engineer

Daily collection and entry of data on the services provided

Manager


Monitoring the performance of services at the facility.
Formation of reporting documentation. Data recheck.
Formation of weekly inquiries on the object

Customer

Control of the volume and timeliness of services provided by the construction control service and the contractor


Manager (remotely)

General control
Analysis of project indicators

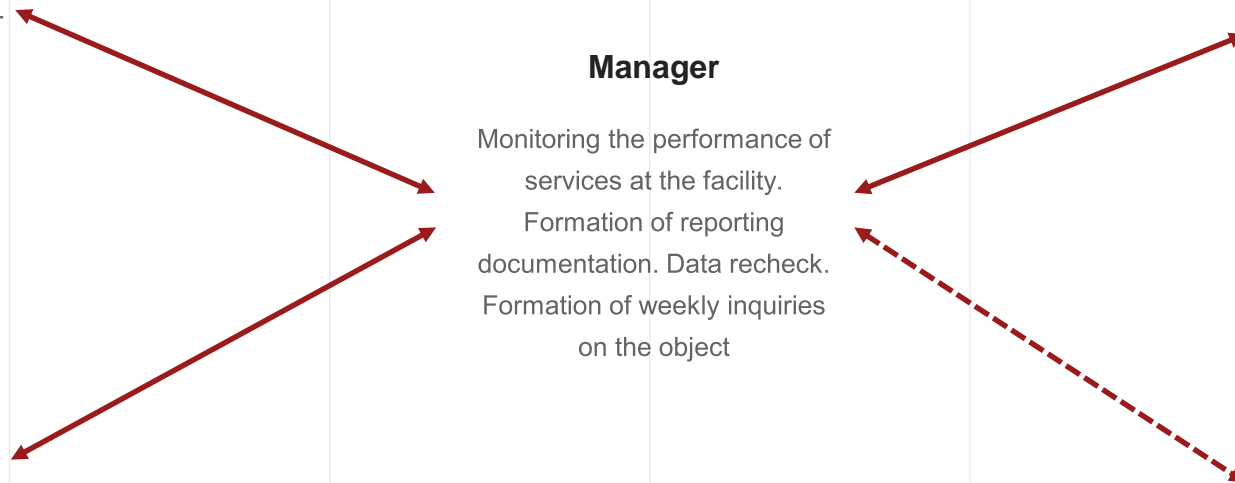

For engineers, the main tasks are:


- timely execution of electronic applications submitted by the contractor;
- daily filling in the diaries of engineers with information on the results of the control;
- formation and introduction of orders and photographic documentation;
- maintaining a register of consideration of executive documentation.

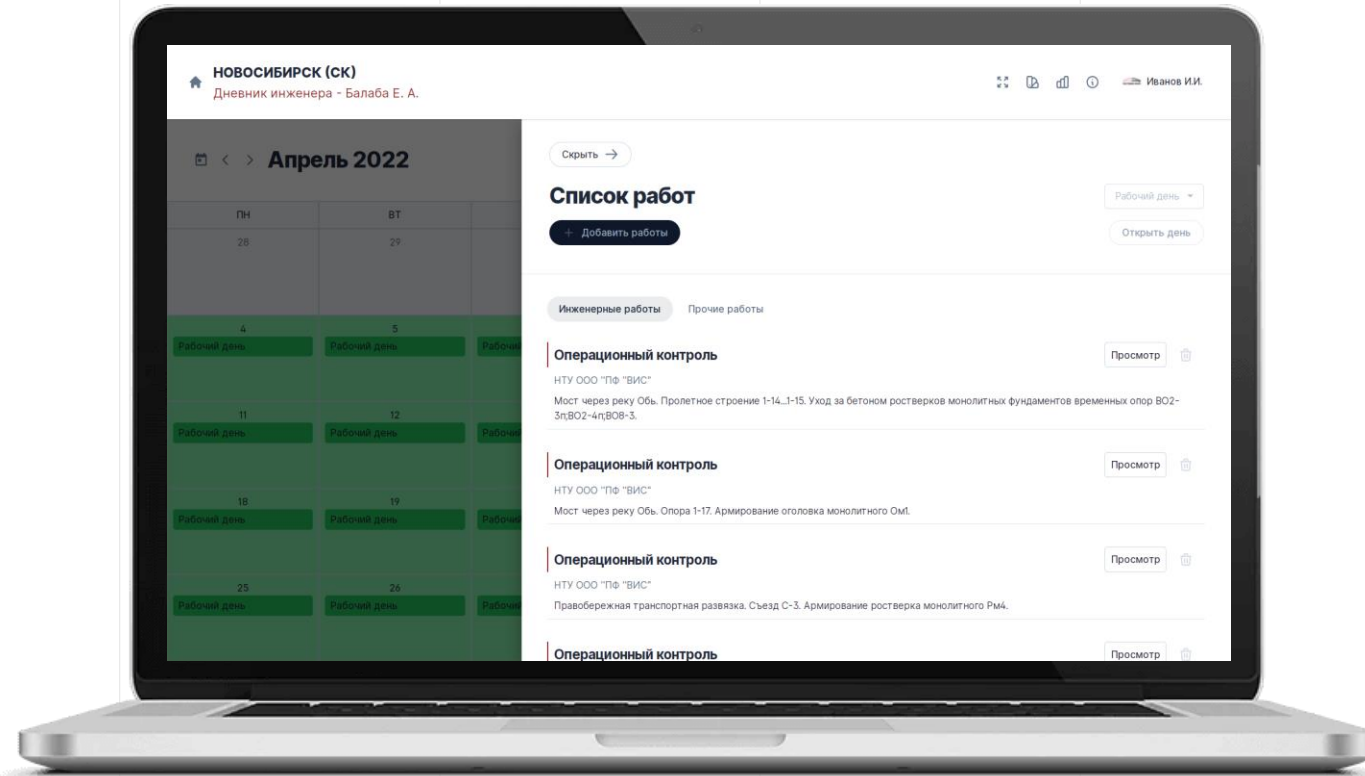

Virtual office

The communication tool is a built-in messenger that allows you to:

- send messages and files over an independent secure channel;
- create group chats and information channels;
- find the contact details of any user in the chat;

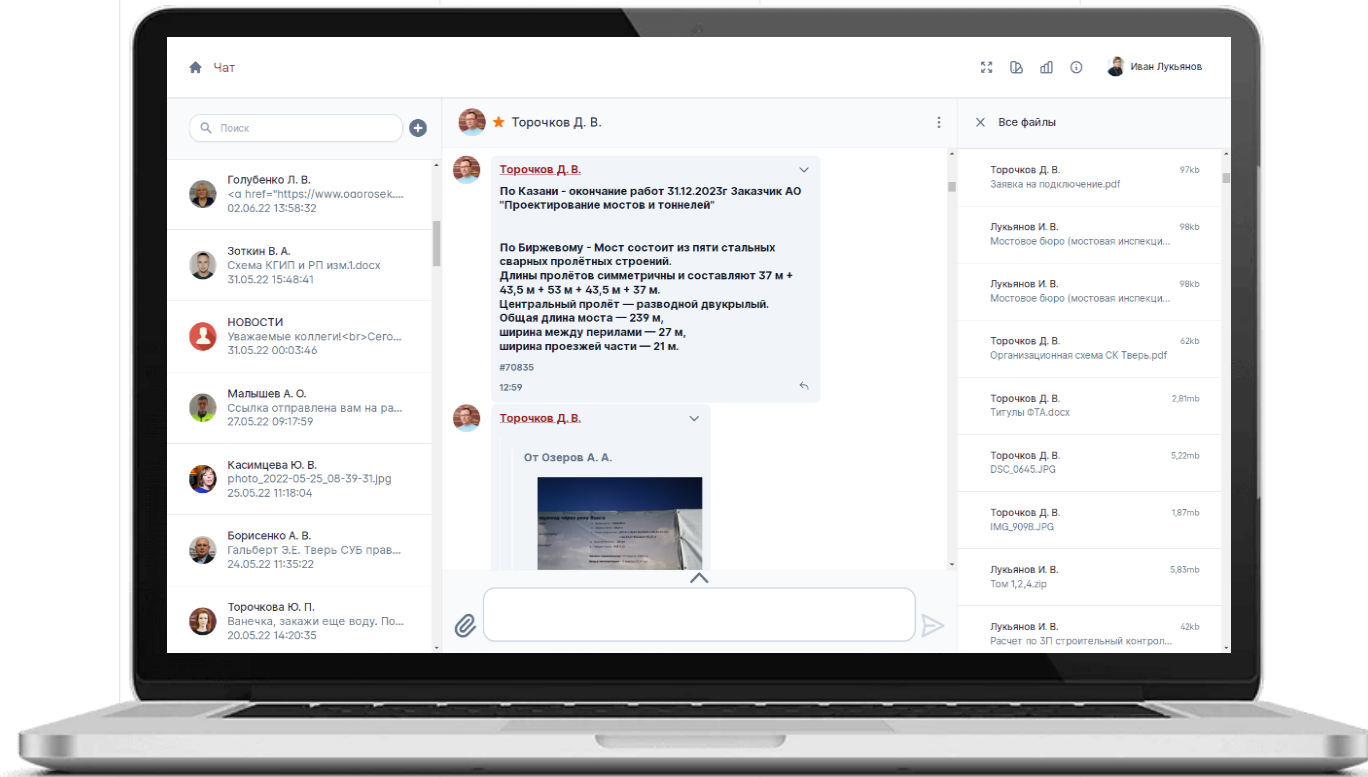

Electronic request system

- Allows to speed up and simplify the interaction of construction participants.
- Supervisory engineers receive information about the required acceptance (control) applications for execution immediately after they are submitted by contractors.
- Contractors, in turn, receive the result of the control immediately after the engineers enter the data.
- The customer has the ability to control the volume and timeliness of execution online.

СК Новосибирск
Заявки СК, НТУ ООО "ПФ "ВИС"


Добавить заявку [Скачать перечень в текущем виде](#)

#	Тип заявки	Дата и время заявки, GMT+8	Описание заявки	Примечание подрядчика	Кем подана / Кем исполняется	Статус
1 #184	Входной контроль	08.12.2022 12:31:23	123	123	Администратор М. Б. / [нет исполнителя]	Не закрыто СК
2 #185	Приемочный контроль	08.12.2022 12:31:23	12	123	Администратор М. Б. / [нет исполнителя]	Не закрыто СК
3 #188	Приемочный контроль	01.12.2022 15:00	один 1	1	Лукьянов И. В. / Желизо Д. В.	Работы не приняты
4 #189	Входной контроль	01.12.2022 15:00	2 123	123	Лукьянов И. В. / Желизо Д. В.	Работы приняты
5 #190	Операционный контроль	01.12.2022 15:00	12 123	123	Лукьянов И. В. / Желизо Д. В.	Не закрыто СК
6 #191	Ультразвуковой контроль	01.12.2022 11:00	ек ке	ке	Лукьянов И. В. / Желизо Д. В.	Не закрыто СК
7 #192	Геодетальный контроль	01.12.2022 09:00	pp pp	pp	Лукьянов И. В. / Желизо Д. В.	Не закрыто СК
8 #197	Приемочный контроль	03.11.2022 16:00	123 123	123	Лукьянов И. В. / [нет исполнителя]	Не закрыто СК
9 #194	Приемочный контроль	01.11.2022 16:00	----- 123	123	Лукьянов И. В. / Александров А. А.	Работы приняты
10 #195	Приемочный контроль	01.11.2022 16:00	111 ;k;k	;k;k	Лукьянов И. В. / [нет исполнителя]	Требуется согласования СК


Items per page: 10 1 - 10 of 41 |< < > >|

Orders system

- Allows supervisors to generate, transfer and close orders within the system.
- The contractor receives prompt information about the comments made, as well as the results of the elimination control.
- The customer gets the opportunity to control the volume and composition of issued orders with reference to contractors.

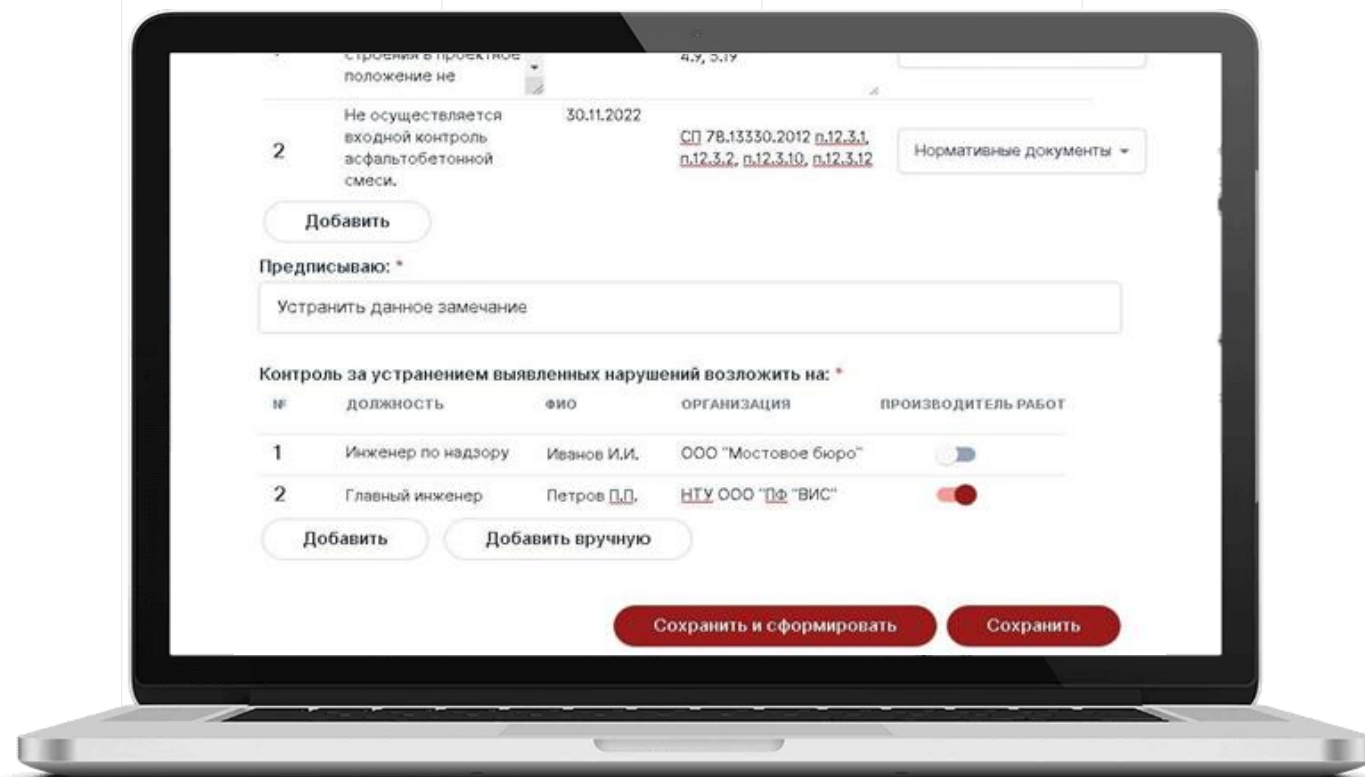

- Allows the manager to evenly distribute the workload of engineers.
- Supervisory engineers can see online and, if necessary, change their work schedule.
- Allows to upload the time sheet in the approved form.

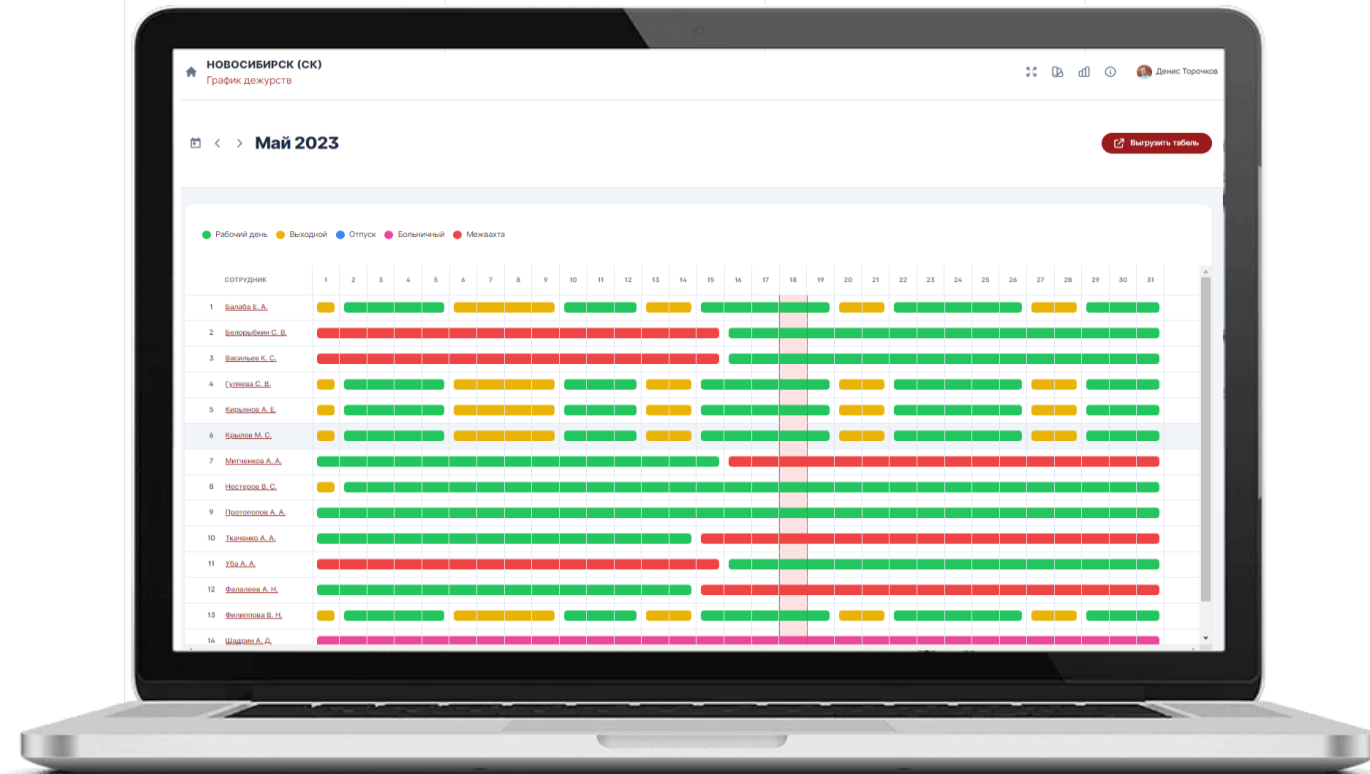



- diaries of engineers - form F-2;
- list of work acceptance certificates - form F-3;
- list of orders and comments - form F-4;
- photographic documentation.

Приложение №2				
реквизиты работ: ООО "Транс-Грип", ЗАО "Фарос", ООО "ПТО", ООО "БДС", ООО "Дальтрансстрой", ООО "Н ПТБ"				
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ДАТА	ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ	ПРИМЕРНЫЕ ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ
1	Акт освидетельствования сыпучих работ Устройство асфальтового основания под устройство песчаной дорожной одежды ТСД на 1000 мм. По плану № 102-79/3 Смариново	01.12.2019	C13/HT/TK2-69/TK2-69/3	19.05.2021
2	Акт освидетельствования сыпучих работ Регулировка подката под опорными плитами асфальтового основания ТСД на 1000 мм. По плану №4. По плану №122-79/3. Смариново	01.12.2019	C13/HT/TK2-69/TK2-7-7	19.05.2021
3	Акт освидетельствования сыпучих работ Устройство обочины карьерной насыпи заполненной асфальтовым щебнем ТСД на 1000 мм. По плану №4. По плану №122-79/3. Смариново	01.12.2019	C13/HT/TK2-69/TK2-10-10	19.05.2021
4	Акт освидетельствования сыпучих работ Устройство обочины карьерной насыпи заполненной асфальтовым щебнем ТСД на 1000 мм. По плану №4. По плану №122-79/3. Смариново	08.12.2019	C13/HT/TK2-69/TK2-6-7	19.05.2021
5	Акт освидетельствования сыпучих работ Обратная засыпка котлована песчаной дорожной одежды ТСД на 1000 мм. По плану №122-79/3. Смариново	13.12.2019	C13/HT/TK2-69/TK2-11-11	19.05.2021
6	Акт освидетельствования сыпучих работ Устройство обочины карьерной насыпи плотной. Тип на опоры №5. По плану на 1000 мм.	12.06.2020	C7/HT/TK100-19/53-43	16.07.2021
7	Акт освидетельствования сыпучих работ. Регулировка подката под фундаментом асфальтового основания на опоры №4 По плану на 1000 мм ТСД на 1000 мм	12.11.2020	C13/HT/TK4-254-48-TR	19.05.2021
8	Акт освидетельствования сыпучих работ. Устройство обочины карьерной насыпи заполненной асфальтовым щебнем на опоры №4. По плану на 1000 мм ТСД на 1000 мм	12.11.2020	C13/HT/TK4-254-48-TR	19.05.2021
9	Акт освидетельствования сыпучих работ. Устройство насыщенной котлована фундаментов асфальтового основания на опоры №4. По плану на 1000 мм ТСД на 1000 мм	14.11.2020	C13/HT/TK4-254-48-TR	19.05.2021
10	Акт освидетельствования сыпучих работ. Обратная засыпка котлована под фундаменты асфальтового основания на опоры №4. По плану на 1000 мм ТСД на 1000 мм	19.11.2020	C13/HT/TK4-254-48-TR	19.05.2021
11	Акт освидетельствования сыпучих работ. Обратная засыпка котлована под фундаменты асфальтового основания на опоры №4. По плану на 1000 мм ТСД на 1000 мм	19.11.2020	C13/HT/TK4-254-48-TR	19.05.2021
12	Акт освидетельствования сыпучих работ Устройство асфальтовой дорожной одежды фракционный состав 0,075 мм. По плану №122-79/3. Смариново	27.01.2021	C13/HT/TK26-100-1-1-TR	19.05.2021
13	Акт освидетельствования сыпучих работ Обратная засыпка котлована под фундаменты асфальтового основания на опоры №4. По плану на 1000 мм ТСД на 1000 мм	28.01.2021	C13/HT/TK26-100-1-1-TR	19.05.2021

№	ДАТА ВЫДАЧИ	ФОРМА ВЫДАЧИ, УЧАСТКИ РАБОТ	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ	ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Предписание, выданные за отчетный период				
1	2022-05-06	Предписание №1/3 Путем письма в течение срока через участкового по территории жилищно-коммунального хозяйства в створе ул. Савинского	ООО "ПСК Кувейт" Выполнение отсчетов и измерений по количеству потребляемого электрической энергии (продажа)	
2	2022-05-06	Предписание №1/3 Мощность: 1 Об.	НПТ ООО "ПФ" "ВПС" Участки выделены (безопасной) с целью контроля конструктивной прочности т.е. мониторинга Тэл. линии 1-11	
3	2022-05-06	Предписание №1/2 Мощность: 1 Об.	НПТ ООО "ПФ" "ВПС" На структурной площадке производится исследование, включая структурные виды материалов и образцов, с нарушением нормативных требований	Получен акт об отсчете от 21.05.2022
4	2022-05-07	Предписание №1/4 Государственная инспекция по тушению пожаров	ООО "Масштабстрой" Экспертная оценка работ не соответствует требованиям ТР ТС 002-1/001 (УС-001-АИР)	
5	2022-05-11	Предписание №6/6 Активизация пометки, указанной на листе работы	ООО ПСК "Реза" Акт об устранении выделенного мероприятия, указанного в предписании № 118	Устранено
6	2022-05-12	Предписание №1/7 Активизация на Службу 3/2 экзоспиральной трансформаторной разгрузки	НПТ ООО "ПФ" "ВПС" Акт об устранении выделенного мероприятия, указанного в предписании № 127	Устранено
7	2022-05-13	Предписание №1/4 Активизация на Службу 3/2 экзоспиральной трансформаторной разгрузки	НПТ ООО "ПФ" "ВПС" Акт об устранении выделенного мероприятия, указанного в предписании № 133	Устранено
8	2022-05-13	Предписание №6/6 Активизация на Службу 3/2 экзоспиральной трансформаторной разгрузки	НПТ ООО "ПФ" "ВПС" Акт об устранении выделенного мероприятия, указанного в предписании № 160	Устранено
9	2022-05-17	Предписание №6/6 Активизация на Службу 3/2 экзоспиральной трансформаторной разгрузки	НПТ ООО "ПФ" "ВПС" Акт об устранении выделенного мероприятия, указанного в предписании № 192	Устранено
10	2022-05-17	Предписание №1/9 Экспертная оценка работ на Службу 3/2 экзоспиральной трансформаторной разгрузки	НПТ ООО "ПФ" "ВПС" Оценочный НПТ, Тел. ж/д. линия. Работы выполняемые работы не приняты (отсутствует) в АООС на регистрационном	-

[illegible]

02.05.2022г. Работы производит НТУ ООО "ТФ "ВНС"
Мост через реку Обь. СДСмУ для сооружения простого строения 1-13...1-16. Приёмочный контроль
динамических испытаний свой временных опор ВО3-1, ВО3-2 представителями ООО "Мостовое бюро"

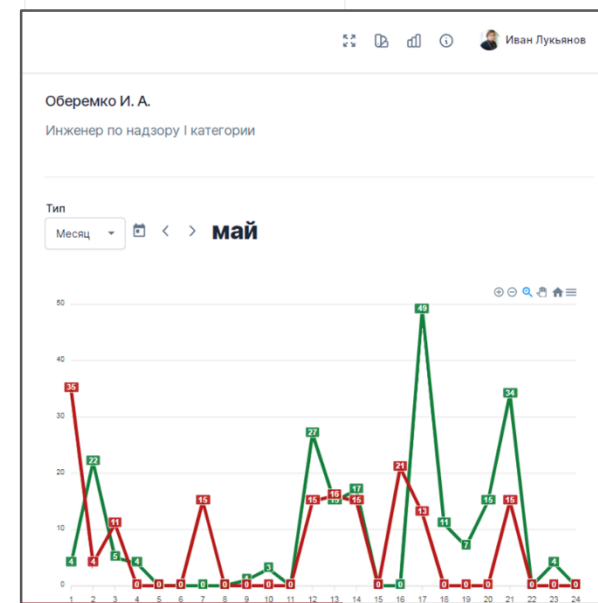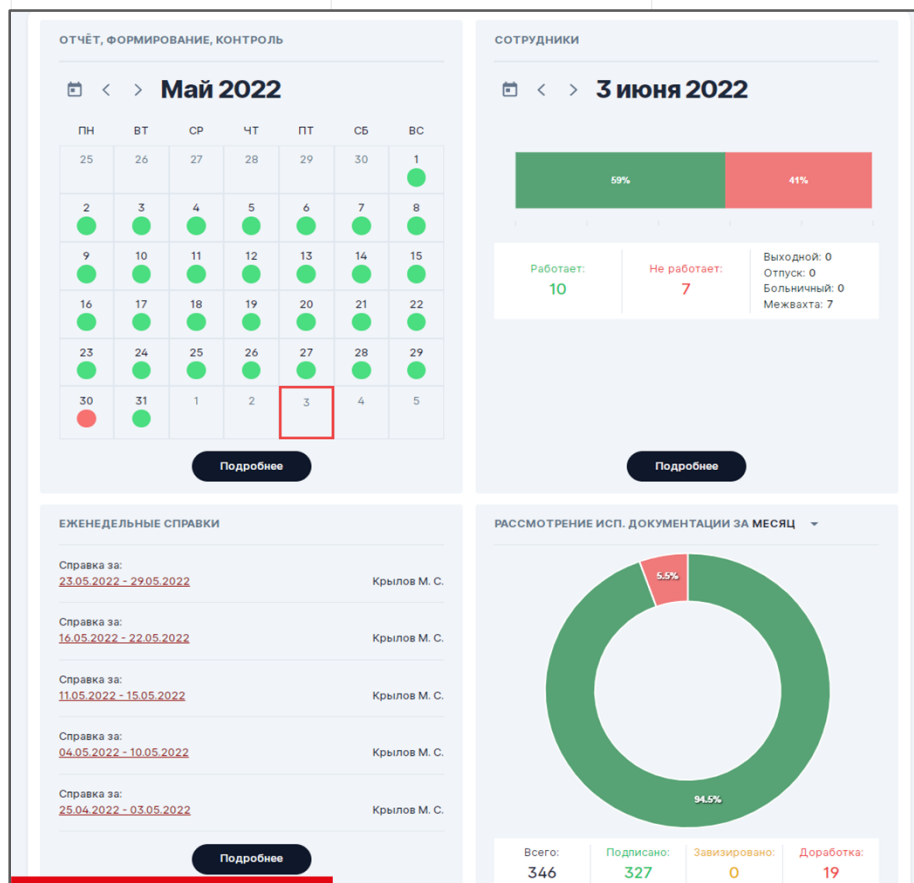

7. Ответственность сотрудников

Фамилия И.О.	Приёмочный контроль	Операционный контроль	Входной контроль	Рассмотрение ИД	Иные работы	Итого
Васильев К. С.	0	0	0	0	7	7
Душин А. В.	22	8	0	0	0	30
Балаба Е. А.	5	0	0	0	4	9
Кириянов А. Е.	15	5	0	0	0	20
Белорыбкин С. В.	12	4	0	0	0	16

The manager receives summary information, which allows him to control the work of employees. Based on the statistical information collected by the system, it is possible to determine the workload of each individual employee.

The Author's Supervision Log section will allow you to maintain a digital open-source author's supervision log with tracking of dates and users who made the entry.

The "Meetings" section will allow Chief engineer of Project to quickly receive the information necessary for meetings from employees from the site and from the project office, as well as transfer the minutes of the meetings to them.

The section "List of approvals for the object" will allow you to track the approval process and quickly transfer information between the participants in the process.

СОГЛАСОВАНИЯ

Письмо	От кого	Дата поступления	Дата ответа	Статус	Ответственный
№347 от 31.05.22	ООО "Один"	21.07.2022	-	В работе	Иванов И.И.
№346 от 21.07.22	ООО "Один"	21.07.2022	-	В работе	Васильев В.В.
№22-ПГ от 20.07.22	ПАО "Два"	20.07.2022	21.07.2022	Согласовано	Дмитриев Д.Д.
№ОТ-22-03 от 18.07.22	ПАО "Два"	18.07.2022	19.07.2022	Не согласовано	Иванов И.И.
№ПГ-32 от 18.07.22	АО "Три"	18.07.2022	18.07.2022	Согласовано	Васильев В.В.

Подробнее

ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Запись в журнал АН 25.05.2022	Иванов И.И.
Запись в журнал АН 23.05.2022	Иванов И.И.
Запись в журнал АН 17.05.2022	Иванов И.И.
Запись в журнал АН 13.05.2022	Иванов И.И.
Запись в журнал АН 10.05.2022	Иванов И.И.

Подробнее


ИНФОРМАЦИЯ ПО СОВЕЩАНИЯМ

Совещание	Объект	Проектный офис	Протокол
31.07.2022			
30.07.2022			
29.07.2022			
28.07.2022			
27.07.2022			

Подробнее

Virtual office

Scheme of interaction of **Architectural supervision at the construction object** within the virtual office

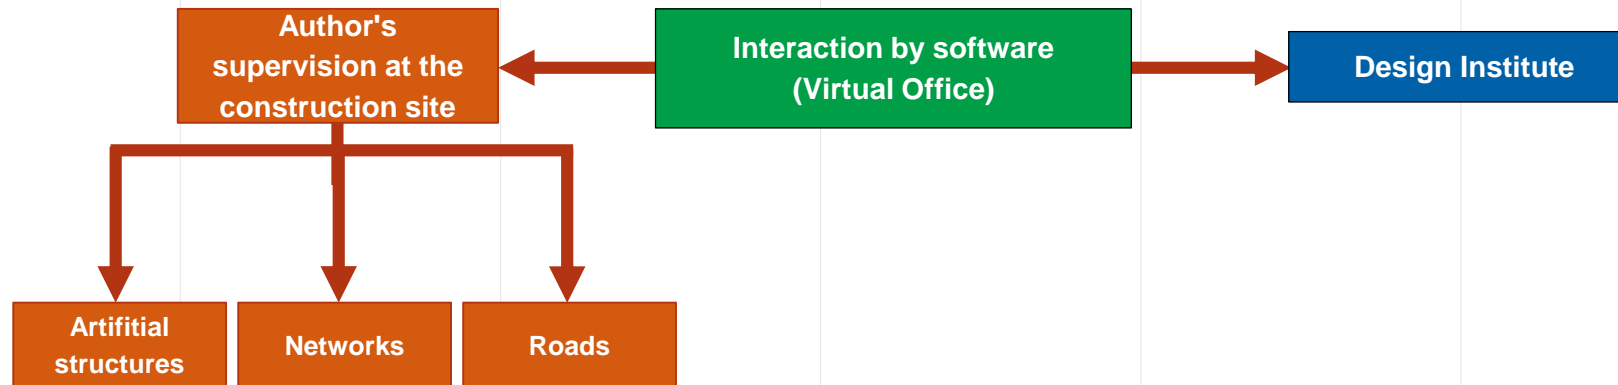

Tasks and opportunities within the system are individually set for each user group.
